


POSTUP PROVÁDĚNÍ :

1. ETAPA : PROVEDENÍ NOVÝCH ZDĚNÝCH PILÍŘŮ V SUTERÉNU V MÍSTĚ PODPOR NOSNÍKŮ IPE240


SUTERÉN-SCHÉMA...PŮDORYS :

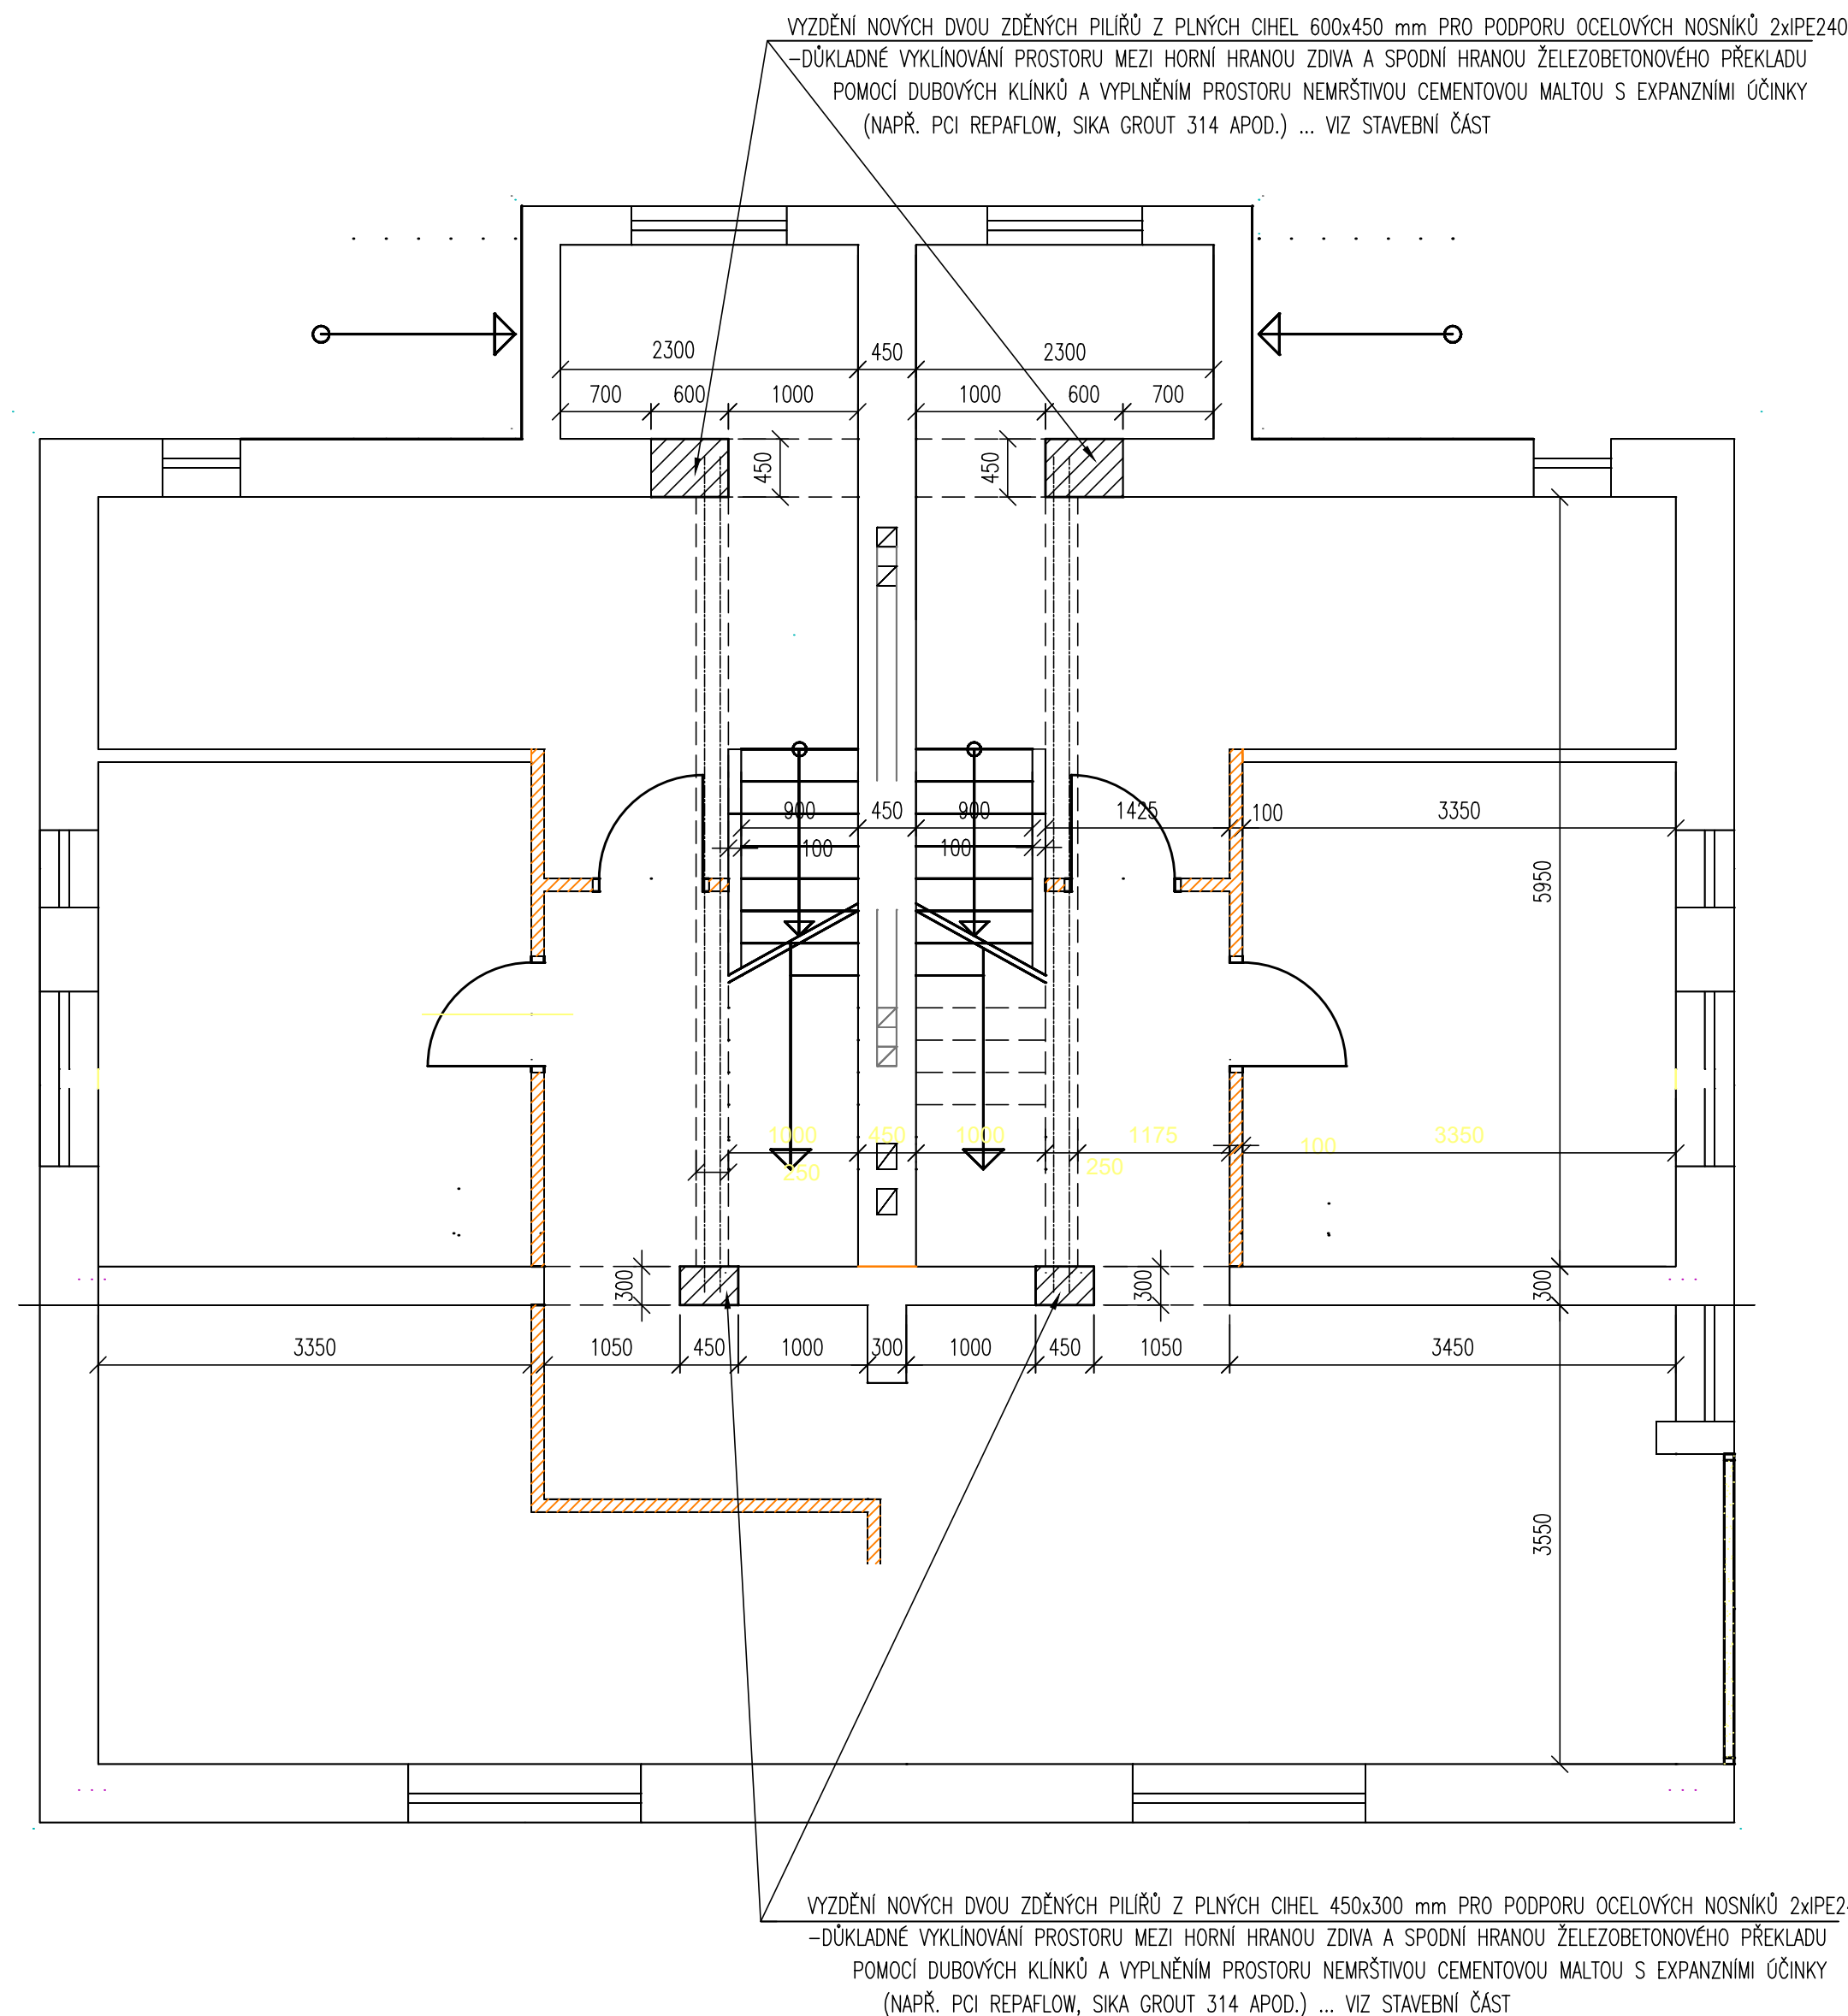

2.ETAPA : OSAZENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ 2xIPE240 (2x) ... VIZ VÝKRES Č. D.3.4.02

3. ETAPA : OSAZENÍ 2x2 MONTÁŽNÍCH STOJEK V MÍSTĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ; VYBOURÁNÍ SVISLÉHO PRUHU O ŠÍŘCE cca 175 mm (ROZŠÍŘENÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ)+
+VYZDĚNÍ ZDIVA TL. 250 mm NAD OCELOVÝMI NOSNÍKY – NOVÉ ZDIVO BUDE PODPOROVAT ŽLB. PRŮVLAK P12 !

PŮDORYS :

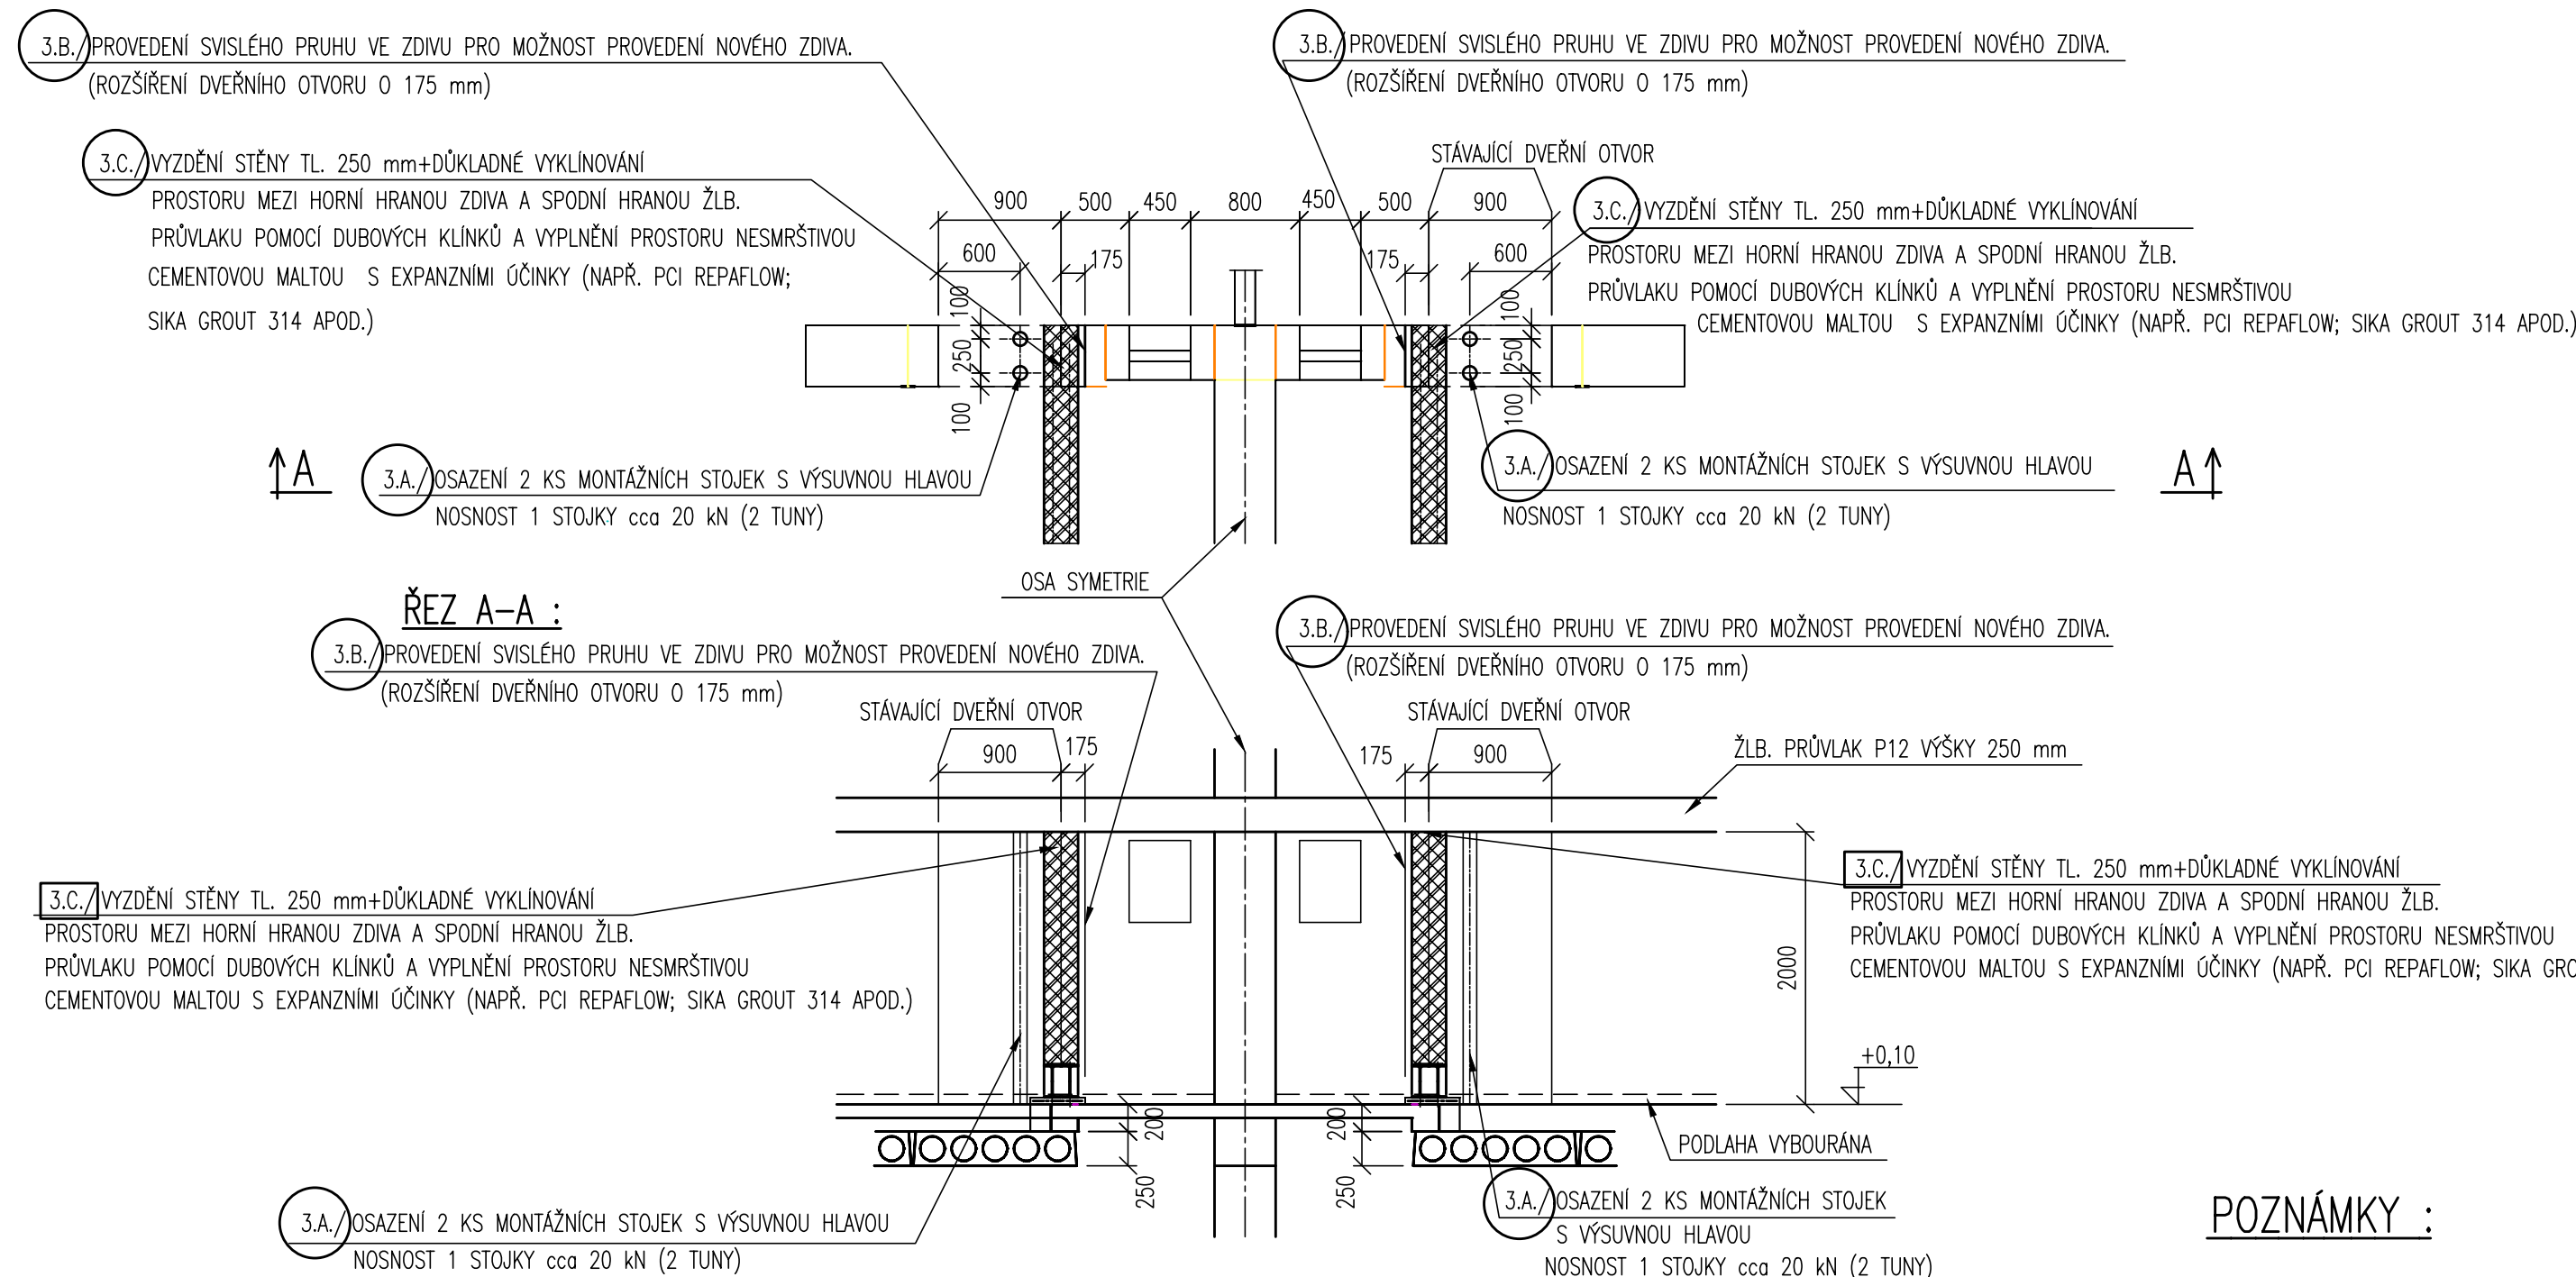

4.ETAPA : VYBOURÁNÍ ZBÝVAJÍCÍCH ČÁSTÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

BOURACÍ PRÁCE – VIZ STAVEBNÍ ČÁST

POZNÁMKA : MONTÁŽNÍ STOJKY ODSTRANIT AŽ PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ V OBVODOVÉ STĚNĚ !

POZNÁMKY :

1./ NELZE VYBOURAT OTVOR ŠÍŘKY 2,25 m POD ŽLB. PRŮVLAKEM P12 - JE NUTNO POSTUPOVAT PODLE NAVRŽENÉHO POSTUPU PROVÁDĚNÍ S PROVIZORNÍM PODEPŘENÍM ŽLB. PRŮVLAKU POMOCÍ MONTÁŽNÍCH STOJEK A S NÁSLEDNÝM VYZDĚNÍM NOVÉHO ZDIVA NA OCELOVÝCH NOSNÍCÍCH, KTERÉ BUDE PODPÍRAT PRŮVLAK P12 !

2./ NAVRŽENÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ BUDE KONZULTOVÁN S DODAVATELEM STAVBY.

revize	popis vydání, změny			vypracoval	datum
ZODP.PROJEKTANT	NAVRHOVAL	KRESLIL		Masarykovo nám.1544, 53002 Pardubice tel. : 466 510 146 e-mail : statici@centrum.cz	
ING. ZIMA	ING. ZIMA	ING. ZIMA			
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ					
AKCE : DVOJDŮM–PŘESTAVBA NA 4 BJ, SPORTOVNÍ Č.P.1337,1338, PŘELOUČ				FORMÁT	6 A4
MÍSTO : PŘELOUČ, SPORTOVNÍ Č.P. 1337, 1338, ST. 1824				DATUM	06. 2025
ČÁST : D.3 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				STUPEŇ	DPS
				MĚRÍTKO	1:50
OBSAH : BOURACÍ PRÁCE V 1.NP V PROSTORU VCHODŮ – – SCHEMATICKÝ NÁVRH POSTUPU PROVÁDĚNÍ				Č.VÝKRESU D.3.4.01	REVIZE : Č.KOPIE
